Proyecto II Unidad 2

Actividad integradora. El backlog y el sprint Schedule del proyecto

Equipo: 3
Manuel Melchor
Susana Martinez
Thania Arredondo

Asesor (a): Armida Griselda Vázquez Curiel

FECHA DE ENTREGA01 DE OCTUBRE

202 2







Formato Backlog


Product backlog: SITIO WEB CALTZONTZIN COMUNIDAD INDIGENA

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
HU001	HOME PAGE / PÁGINA DE INICIO	НР	EN DESARROLLO	15	1	ALTA	PRIMERA IMAGEN
HU002	MENÚ INTERACTIVO	МІ	EN DESARROLLO	5	1	ALTA	DISEÑO ATRACTIVO
HU003	PÁGINA HISTORIA	PH	EN DESARROLLO	58	1	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU004	PÁGINA GASTRONOMIA	PG	EN DESARROLLO	58	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU005	PÁGINA CULTURA TRADICIÓN	PCT	EN DESARROLLO	58	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU006	PAG. FORMULARIO RESERV	PFR	EN DESARROLLO	30	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU007	DOMINIO WEB	DW	EN DESARROLLO	10	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN
HU008	HOSTING	HOS	EN DESARROLLO	9	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN
HU009	CERTIFICADO SSL	CSSL	EN DESARROLLO	2	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN

Backlog con fechas

Nombre de tarea	Duración hrs	Inicio	Termino	Observaciones	
HOME PAGE / PÁGINA DE INICIO	15	28/09/2022	03/10/2022	FINALIZADA Y APROBADA	
MENÚ INTERACTIVO	5	29/09/2022	30/09/2022	FINALIZADA Y APROBADA	
PÁGINA HISTORIA	58	06/10/2022	12/10/2022	En progreso	
PÁGINA GASTRONOMIA	58	27/09/2022	07/10/2022	En progreso	
PÁGINA CULTURA TRADICIÓN	58	30/10/2022	12/10/2022	En progreso	
PAG. FORMULARIO RESERV	30	07/10/2022	12/10/2022	En progreso	
DOMINIO WEB	10	30/10/2022	05/10/2022	En progreso	
HOSTING	9	06/10/2022	08/10/2022	En progreso	
CERTIFICADO SSL	2	08/10/2022	10/10/2022	En progreso	

Fichas de Backlog

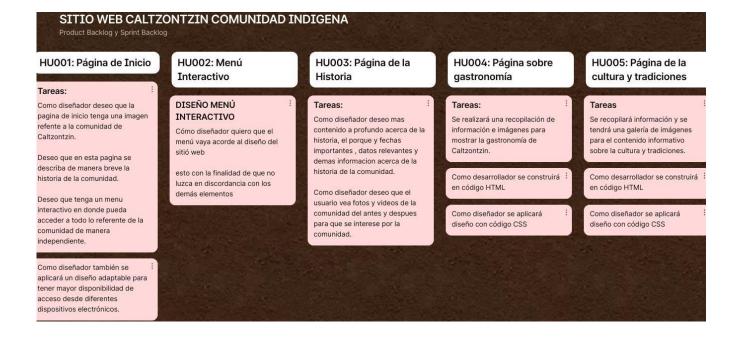


HU006: Página con HU007: Dominio y HU008: Hosting para la HU009: Certificado de formulario de elementos de seguridad seguridad SSL reservación web T- Elección T- Elección T- Búsqueda de nombre Como responsable quiero que la Como responsable quiero que el elección del hosting sea en sitio cuente con certificado ssi el como responsable: quiero hacer relación costo-beneficio cual le brinde seguridad a los información del usuario con el fin una evolución adecuada sobre el usuarios. de habilitar la opción de reserva en registro del dominio y la mejor quiero que el sitio web cargue de caso de que se desee visitar opción. manera rápida, tenga asistencia Se realizará una investigación Caltzontzin. técnica, un buen almacenamiento, acerca del certificado más Como desarrollador se construirá en código HTML el formulrio de T- Elección del nombre esto con la finalidad de facilitar los se realizará una investigación de las mejores opciones y se procesos adecuados para el Cómo responsable quiero realizar presentară al equipo para que la proyecto una reunión con el equipo para determinar los criterios de con código CSS una galería de aceptación para el nombre del T- Generar una petición Esto con la finalidad de que se imágenes para hacer una vista tenga el mejor hosting web para más amena y dar motivación para administrar la pagina como responsable quiero que el que el usuario decida visitar. certificado sel cumpla con todos el concepto del sitio, corto y los requisitos y procedimientos conciso, esto con la finalidad de T-Aplicación atraer al publico deseado. Como responsable quiero que la aplicación del hosting sea eficaz . Quiero que la elección sea se debe generar una petición crs aprobada por todos los miembros para poder validar y verificar el una vez aprobada la elección y el con la finalidad de que no haya certificado, previamente habiendo presupuesto se ejecutarán los desacuerdos futuros. procesos necesarios para la certificado adecuado. aplicación del hosting esto con la finalidad de que la instalación sea de forma más T-Elección de la extensión como desarrollador quiero que la extensión sea adecuada al país de T- Instalación de origen del sitio web además lo más certificado SSL conveniente para el proyecto Como responsable quiero que la esto con la finalidad de tener una instalación sea de la manera más rápida y eficaz además de efectiva T- Registro de dominio se ingresará al c- panel de nuestro Cómo responsable quiero validar administrador de la pagina en donde se lo realizará la opción de esté ocupado certificado , realizado de manera adecuada todos los pasos contar con mínimo dos opciones de ser este el caso. esto con la finalidad de agilizar el Esto con la finalidad de no tomar tiempo de instalación. más tiempo de lo ya establecido

Sprint

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
HU001		Manuel Melchor		4 días	10 hrs	5hrs				1
Elaboración del menú de opciones	3			2 día	2hrs	2hrs				
Diseño web responsivo	5			2 días	3hrs	3hrs				
HU002		Manuel Melchor		1 día			6 9			6
Elaboración del código para MI	3			1 día	5hrs					1
HU003		Manuel Melchor		12 días	14 hrs	14 hrs	10hrs	10hrs	10hr s	
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3			2 días	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	1
HU004		Susana Martinez		12 días	14 hrs	14 hrs	10hrs	10hrs	10hr s	
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3			2 días	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	

Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU005		Susana Martinez		12 días	15 hrs	15rhs	15rhs	15hrs	15hr s	2
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3			2 días	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU006		Susana Martinez	ASIGNADO	6 días	15 hrs	15 hrs				2
Recopilación de información y galería de imágenes par Para el contenido	3			2 días	4hr	4hr				
Código html				2 días	6hrs	6hrs				
Código css				2 días	5hrs	5hrs				
HU007		THANIA ARREDONDO		5 días	10hrs					2
Búsqueda de nombre	3		1	1 día	3hrs			1		
- Hacer investigación detallada sobre la mejor opción para el registro.					2 hrs					
Elección del nombre	3		1	1 día	1 hrs					
-Reunión con el equipo para determinar los criterios y finalidad del nombre.			ASIGNADO	1 día	30min					
-la elección debe estar aprobada por todos los miembros						0				TA.
Elección de extensión	5				30min					
-Elección de la extensión en base a la finalidad del proyecto y el país de origen					30min					
Registro de dominio	5			1 día	3hrs					
-Validar que el nombre elegido esté disponible. - contar con mínimo dos opciones más por si el dominio ya existe				1 día	3hrs					
HU008		THANIA ARREDONDO		3 días	6hrs	3hrs				3
Investigación para la elección Relación Costo-beneficio	3			2 días	3hrs	3hrs				
Elección y aplicación de hosting	5] [1 día	3hrs				40 00	
HU009		THANIA ARREDONDO		3 días	2hr					3
Selección del tipo de certificado adecuado	3			1 día	1hra					
Generar petición CSR	3			1 día	30min					
Instalación del certificado SSL	5	8		1 día	30min					
Total	102			58	89	66	35	35	35	3

Burndown chart



Control chart

